

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Čl.1 Zmluvné strany

1.1. Zhotoviteľ : Ľubomír Dado
 Osloboditeľov 931/17
 963 01 Krupina

Štatutárny zástupca : Ľubomír Dado, osobne
Bankové spojenie : VÚB, a.s., Zvolen, pobočka Krupina
č. účtu : SK45 0200 0000 0012 2394 7853
IČO : 34788905
DIČ : 1020605740
Zapísaný v OR OS Banská Bystrica Odd S r.o. vo vložke 605-1082 vydaný OU
Zvolen

1.2. Objednávateľ : Mesto Krupina
 Svätotrojičné námestie 4/4
 963 01 Krupina

Štatutárny zástupca: Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
Bankové spojenie : VÚB, a.s., Zvolen, pobočka Krupina
č. účtu : SK24 0200 0000 0000 2002 0412
IČO : 00320056
DIČ : 20211525540
IČ DPH : nie je platca DPH
Telefón : 0421 45 5550311
Fax : 0421 45 5550325

Preambula

1. Dňa 21.03.2018 bola uzavretá zmluva o dielo č. 52/2018/OVZP medzi zhotoviteľom Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina, IČO: 34788905 a objednávateľom Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056 predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo „**Statické zabezpečenie krovu Mestského úradu Krupina**“(ďalej len „zmluva“). Zmluva bola upravená a zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 16.07.2018.

2. Z dôvodu :

- vysokej náročnosti remeselnej práce, keď sa musia zachovať tesárske spoje ako sa robili koncom 19. a začiatkom 20. storočia / podľa nariadenia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici /
- kolízie prác s firmou ktorá renovuje fasádu vznikol nedostatok miesta na dvore MsÚ, čím vznikla prekážka vyloženia materiálu aj niekoľko dní,
- v povalovom priestore je málo miesta nedá sa nasadiť väčšie množstvo pracovníkov, čím sa predlžuje čas plnenia a ukončenia diela,
- kvôli riziku zatečenia nie je možné odkryť veľkú plochu, bolo by riziko pri silnejšom vetre pri väčšej ploche dočasnej strechy jej poškodenie a prípadné zatečenie

do priestorov MsÚ,

- vážny problém vznikol na strane zhotoviteľa požiadavkou objednávateľa na navýšenie pôvodného množstva reziva zo 4,98 m³ na 82,017 m³ čím vznikol objektívny dôvod na zmenu termínu ukončenia a odovzdania diela.

Na základe uvedeného Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 21.03.2018, predmetom ktorej je dodať dielo „ Statické zabezpečenie krovu Mestského úradu Krupina “ v súlade s čl. 11., bod 11.3. citovanej zmluvy.

Čl. I. Predmet dodatku

2. Článok 4. Čas plnenia sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie ods. 4.1 čl. 4 zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré znie:

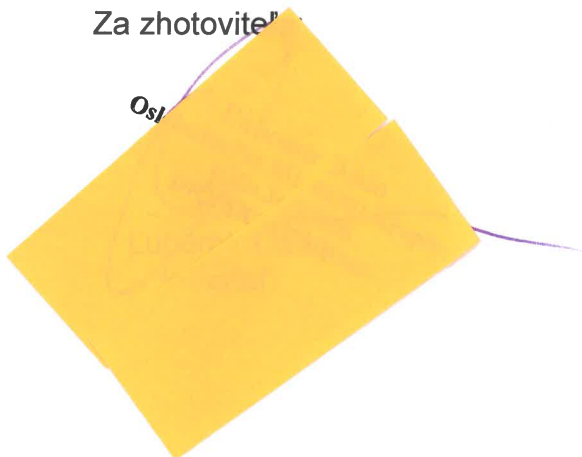
Zmluvné strany sa dohodli, že termín ukončenia diela sa mení a dojednáva sa na z pôvodných 130 dní od účinnosti dodatku č. 1 na nový termín, do 31.3. 2019.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené v platnosti.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

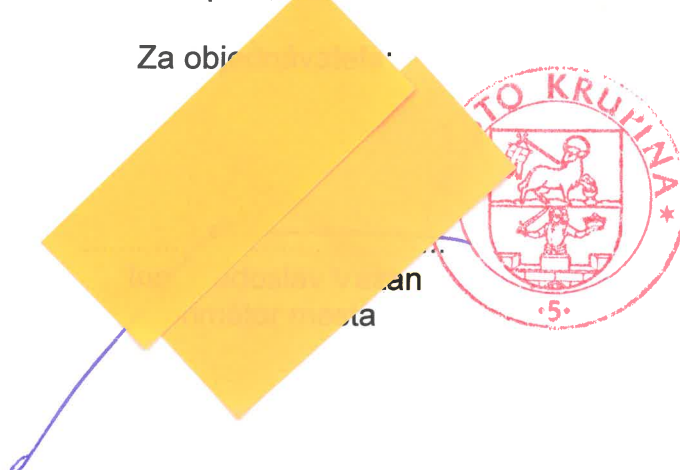
V Krupine, dňa : 9. 11. 2018

Za zhotoviteľa

Ost


V Krupine, dňa : 19. 11. 2018

Za obidve strany


an
sta
